
Desglose detallado de tareas técnicas y estado de avance

TAREA TÉCNICA	RESPONSABLE	FECHA PLANIFICADA	% DE AVANCE	ESTADO	EVIDENCIA ASOCIADA
2.4 Desarrollo de Seeders idempotentes para población de MVP	Angel	Semana 5	100%	*Completada*	*Logs de ejecución de script seeds_ops.py en BD*
3.2 y 3.3 Seguridad RBAC (require_admin), Endpoints /admin/ops y Pydantic	Paula	Semana 5	100%	Completada	Código de rutas en ops.py y dependencias
6.1 Colección de peticiones y pruebas de API (Admin vs Company)	Antonia	Semana 6	100%	Completada	Capturas en Postman (HTTP 200 OK y 403 Forbidden)
7.1 y 7.2 Configuración y Validación de Docker Compose (6 servicios)	Angel y Paula	Semanas 4-6	100%	Completada	Captura de terminal con contenedores "Up/Healthy"
3.4 Desarrollo de catálogos globales y métricas operativas	Paula	Semanas 6-7	20%	A tiempo	Rama de desarrollo inicial activa en GitHub

Entregables del proyecto y criterios de éxito

ENTREGABLE	TAREAS ASOCIADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN MEDIBLE	FECHA COMPROMETIDA
HITO 1: MVP con base de datos operativa	2.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 6.1	Modelos ORM, seeders ejecutados sin errores y endpoints /admin respondiendo con seguridad RBAC validada.	03 de octubre
HITO 2: Tener todo el proyecto en Docker	7.1, 7.2	Levantamiento local exitoso del archivo docker-compose.yml con los 6 servicios en estado Healthy.	31 de octubre
HITO 3: Proyecto entregado y documentado	8.1, 8.2, 9.1, 9.2	Plataforma desplegada en producción (100% uptime en pruebas) y manual técnico aprobado.	28 de nov / 04 de dic

Evidencias de avance

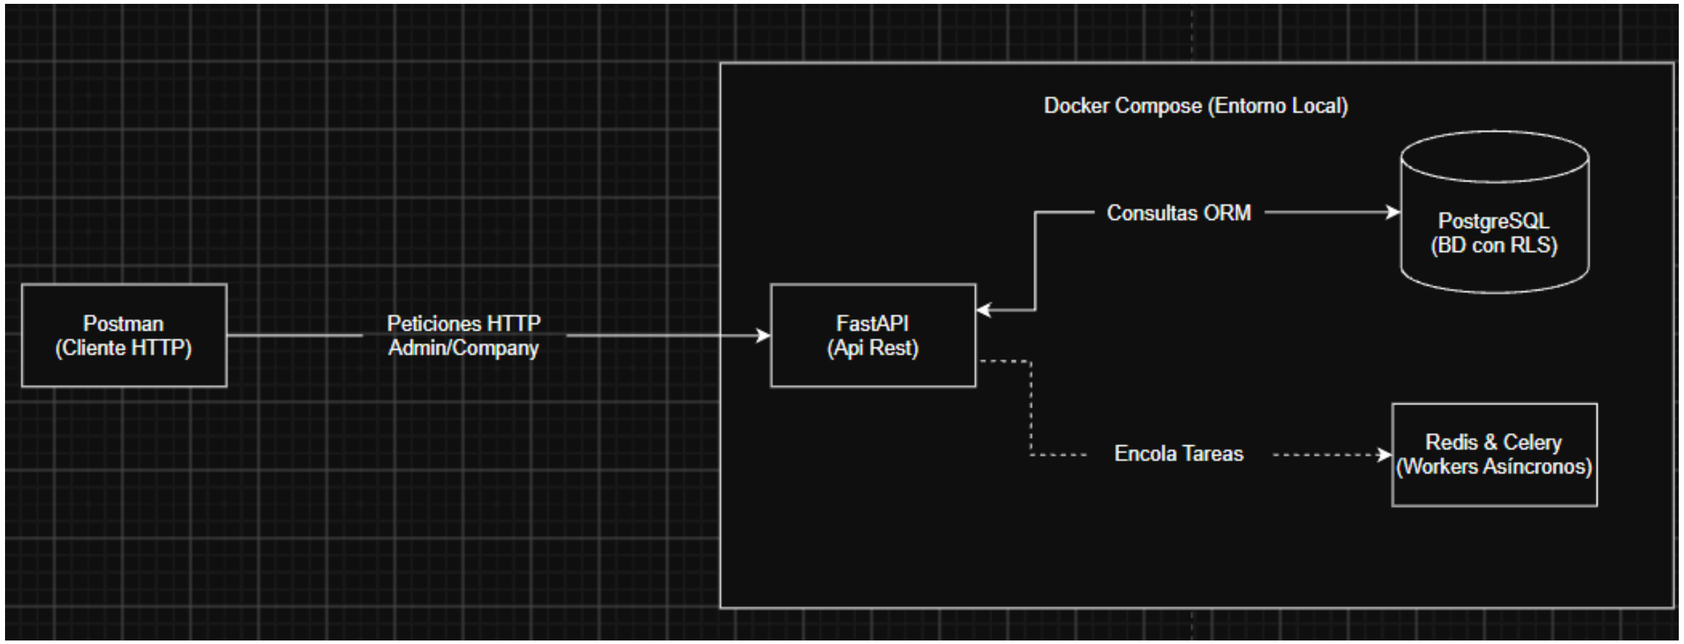

Evidencias de avance

Prueba 1: Ejecución de contenedores base.


Resultado esperado: 6 servicios en estado Healthy.

Resultado obtenido: Contenedores operativos.




Evidencias de avance

Prueba 2: Petición rol Admin

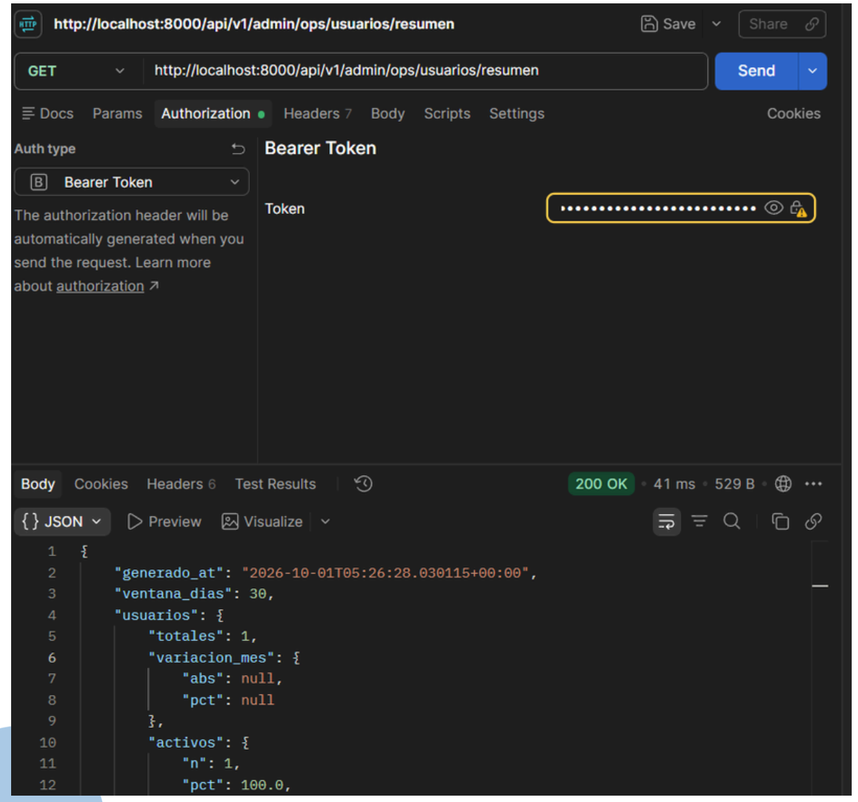

Esperado: HTTP 200 OK.
Obtenido: Acceso concedido.

Prueba 3: Petición rol Company

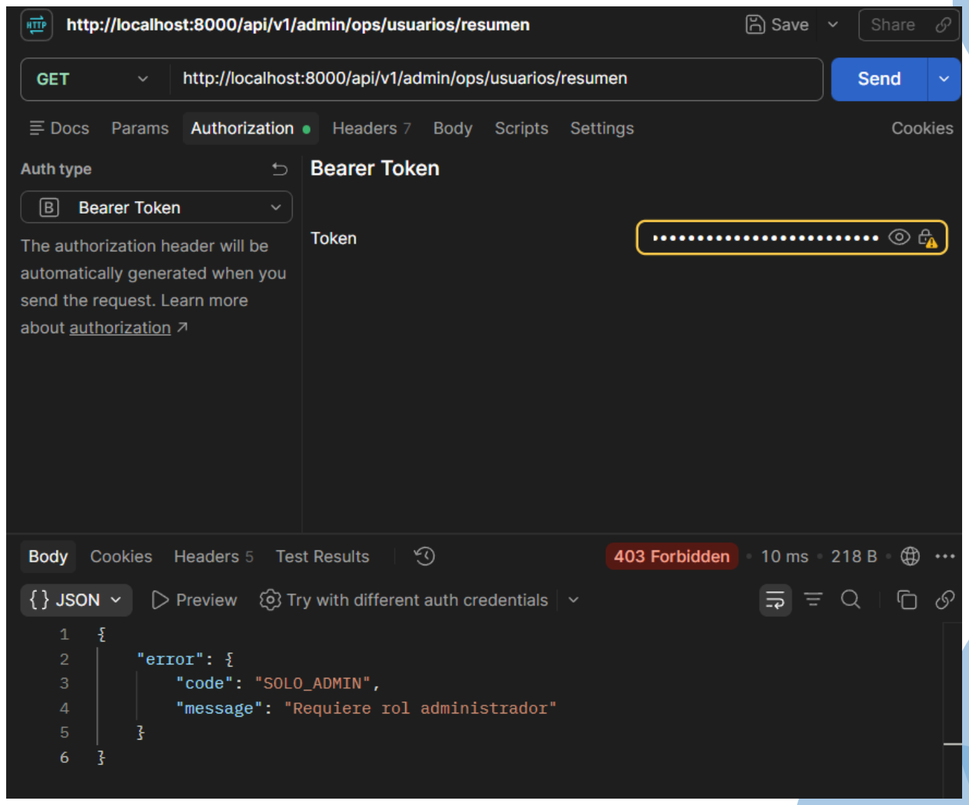

Esperado: HTTP 403 Forbidden.
Obtenido: Acceso denegado.
